ПРОЕКТ: С. МАКЕДОНИЈА UNIDO OHIS СЕРИЈА 1
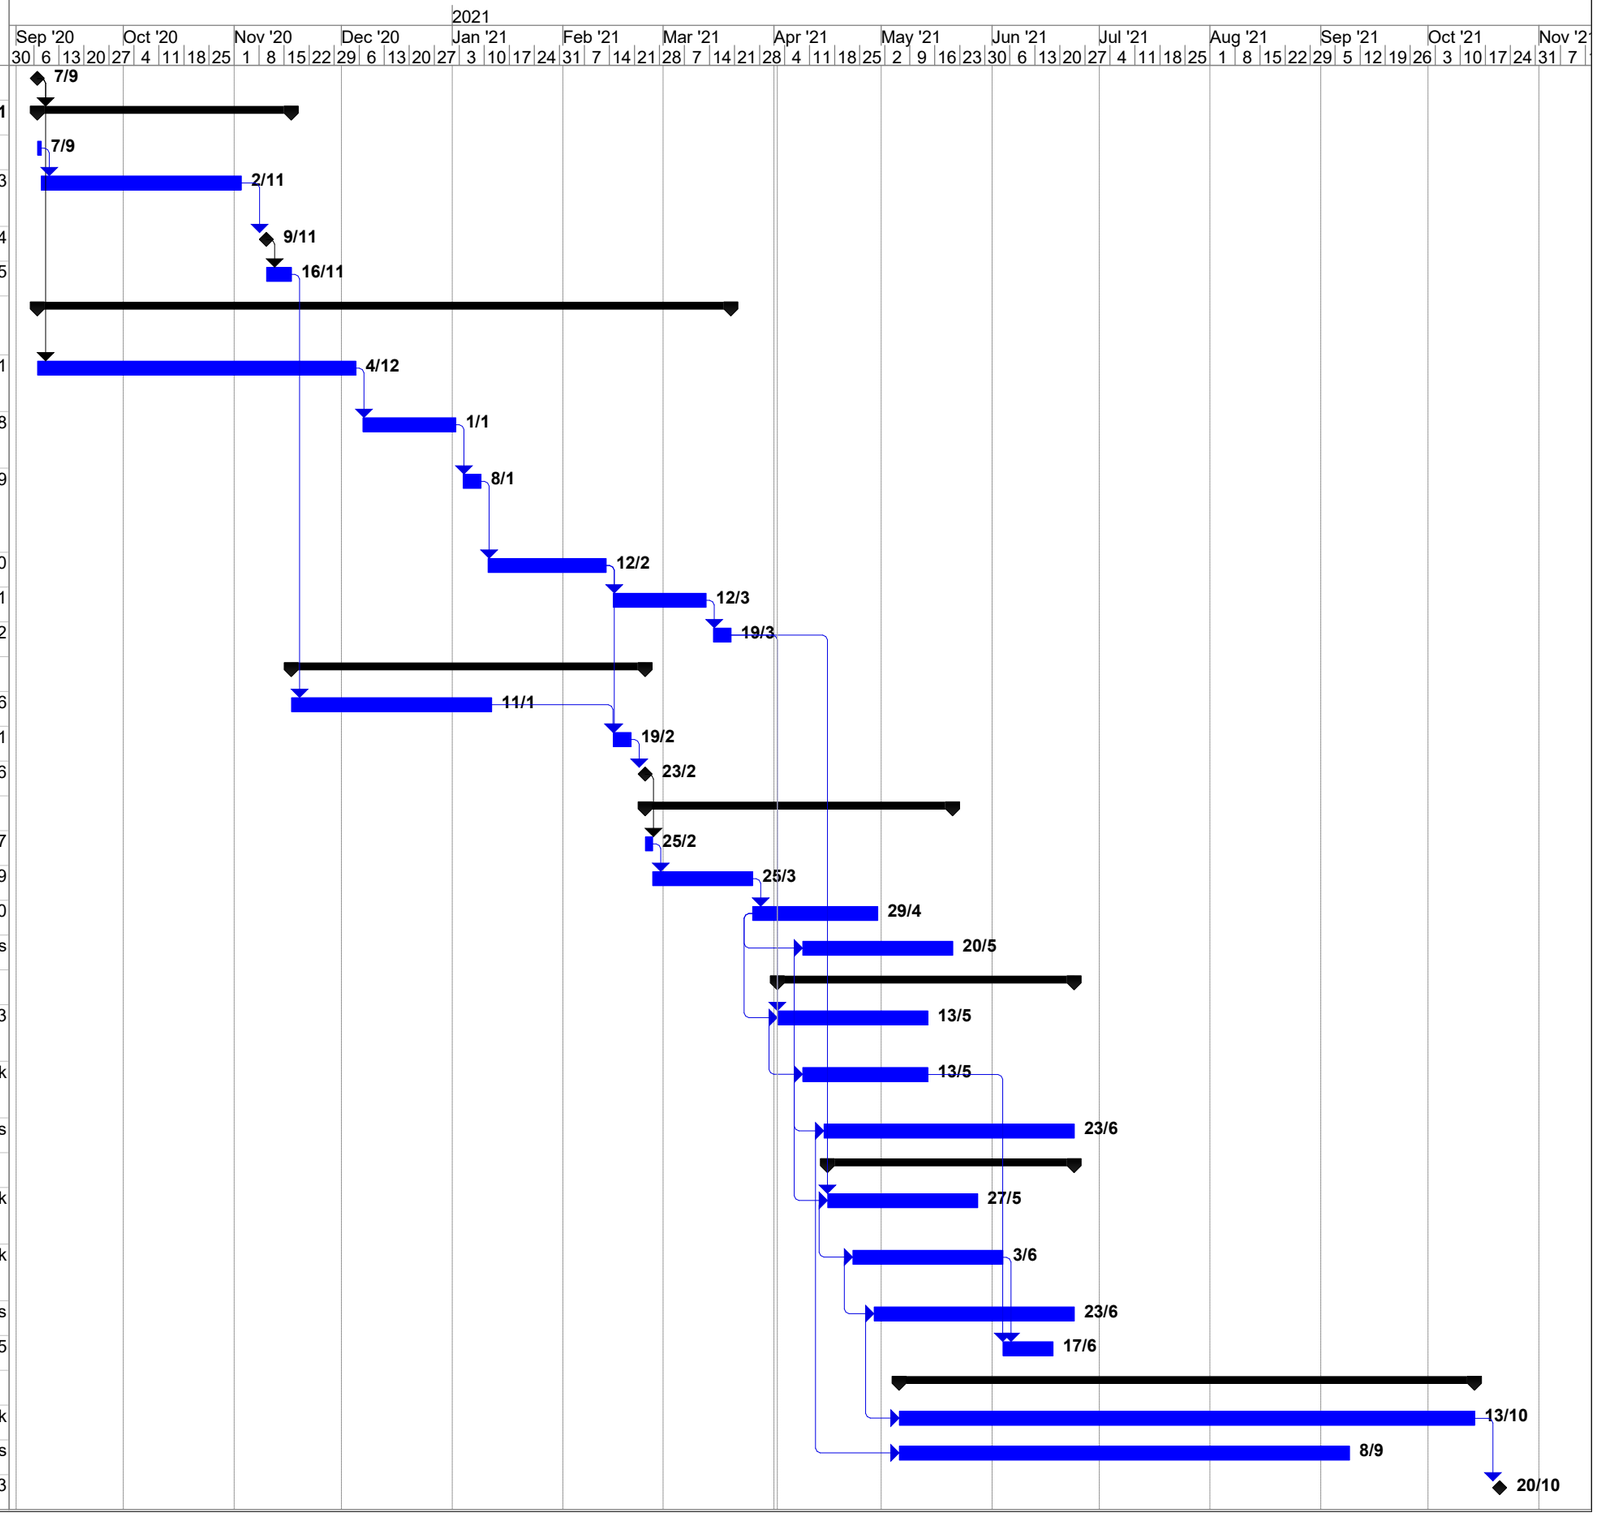
ID	Task Name	Duration	Predecessors
1	**Почеток**	0 days	
2	**Извештаи за мобилизација**	**51 days**	**1**
3	Почетен состанок	1 day	
4	Подготовка и поднесување на плановите за мобилизација (план за санација на локацијата)	8 wks	3
5	UNIDO: План за преглед	1 wk	4
6	Корекција на плановите	1 wk	5
7	**Прекугранични дозволи во согласност со Базелската конвенција**	**140 days**	
8	Поднесување на документи со известувања до надлежниот орган во С. Македонија	13 wks	1
9	Оценување на пријавата од страна на надлежниот орган во С. Македонија	4 wks	8
10	Испраќање на пријавата до надлежните органи на земјите на крајно отстранување (Франција и Холандија) и на транзитните земји	1 wk	9
11	Одобрение и согласност од земјите на крајно отстранување	5 wks	10
12	Согласност од транзитните земји	4 wks	11
13	Согласност од С. Македонија	1 wk	12
14	**Обезбедување на опрема**	**71 days**	
15	Набавка на опрема	8 wks	6
16	Испорака на опремата во С. Македонија	1 wk	15;11
17	UNIDO: Проверка и прифаќање на опремата	2 days	16
18	**Пакување**	**62 days**	
19	Обука на локалниот персонал и засегнатите страни	2 days	17
20	Поставување на локацијата	4 wks	19
21	Ископување и пакување на контаминираната почва	5 wks	20
22	Ископување и пакување на НСН-отпад	6 wks	21SS+2 wks
23	**Испраќање во АТМ (Холандија)**	**59 days**	
24	Резервација на контејнер-брод и подготовка за извоз од С. Македонија	6 wks	21SS+1 wk;13
25	Полнење на контејнерите со отпад, транспорт до пристаништата и царинење	5 wks	24SS+1 wk
26	Испраќање на отпадот до крајните објекти за отстранување	10 wks	25SS+4 days
27	**Испраќање во Треди (Франција)**	**49 days**	
28	Резервација на контејнер-брод и подготовка за извоз од С. Македонија	6 wks	13;22SS+1 wk
29	Полнење на контејнерите со отпад, транспорт до пристаништата и царинење	6 wks	28SS+1 wk
30	Испраќање на отпадот до крајните објекти за отстранување	8 wks	29SS+4 days
31	**Демобилизација**	2 wks	29;25
32	**Третман на отпадот**	**115 days**	
33	Третман на отпадот во објектите на Треди	23 wks	30SS+1 wk
34	Третман на отпадот во АТМ	18 wks	26SS+3 wks
35	**Поднесување на краен извештај**	1 wk	33
